



VICERRECTORADO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

CARTERA ESTRATÉGICA DE PROYECTOS TIC 2022. JUNIO


1. Las cifras de la edición 2022.....	2
2. Proyectos finalizados	2
3. Proyectos en curso.....	3
4. Proyectos retrasados sobre la fecha prevista de finalización.....	4
5. Proyectos retrasados sobre la fecha prevista de comienzo.....	5
6. Proyectos no planificados	5
7. Proyectos que no serán abordados.....	5
8. Proyectos seleccionados.....	6
9. Edición 2021 de la Cartera, proyectos finalizados	8
10. Otros proyectos y tareas abordadas que afectan al desarrollo de la Cartera	8

1. Las cifras de la edición 2022

Proyectos seleccionados: [82](#)

Proyectos finalizados hasta junio: [14](#) *

Proyectos en ejecución: [42](#)

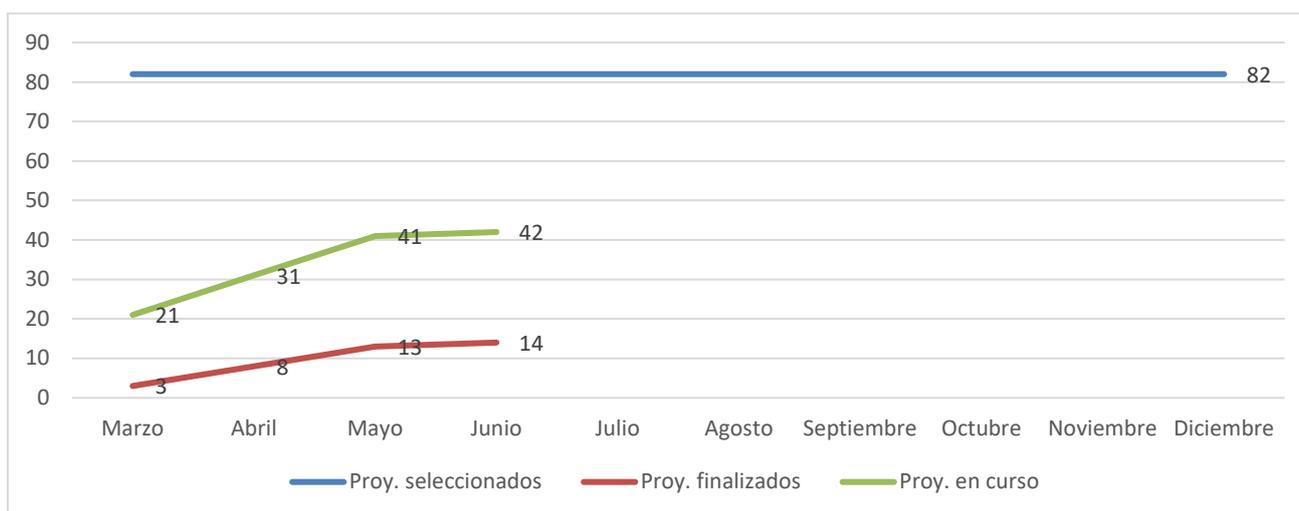

(*) Al margen de los 14 proyectos finalizados y cerrados, 6 de los que se encuentran en ejecución están ya en producción o bien finalizados a la espera de las fechas adecuadas para ello.

2. Proyectos finalizados

Relación de proyectos finalizados:

2022-57	Gestion de Logs de www.ual.es
2022-66	Servidor Virtual. Unidad de Formación Continua
2022-72	uMove (parte normativa de la solicitud realizada)
2022-36	Renovacion Audiovisual Aula Judicial
2022-33	Instalacion Audivisual 2 Salas Reuniones CAE
2022-34	Instalacion Audivisual 1 Sala Reuniones Central
2022-102	Sistema Centralizado de Administracion de Equipos
2022-04	Censos electrónicos
2022-73	Oferta Plazas movilidad
2022-01	Mejora de control de acceso a encuestas de satisfacción con la labor docente
2022-42	Nueva solicitud de Certificaciones y Acreditaciones Académicas al Alumno
2022-74	Asignaturas otros idiomas
2022-67	Capa SOA Académico
2022-53	Implantación de una herramienta de Chatbot

3. Proyectos en curso

Relación de proyectos cuya ejecución ha comenzado:

2022-19	Inhabilitación de cuentas de usuario en la UAL
2022-98	Implantación uMove en Alicante y Cádiz
2022-75	Sustitución De Enfriadoras CPD
2022-100	uMove-EWP-IIAs Finalizado y en producción. Sigue en ejecución para incorporar los errores/mejoras que aparezcan
2022-65	Actualización de la versión de Concrete
2022-13	Web Doctorado EIDUAL
2022-08	Webs de Cultura, Cursos de Verano y Universidad de Mayores
2022-70	Web de Study Abroad
2022-15	Implantación de Power BI en la gestión económica de la UAL
2022-12	Aplicación Compromiso Documental Doctorado Finalizado a falta de revisión funcional y paso a producción (prevista para la segunda semana de julio)
2022-69	Listas distribución masiva
2022-92	Tecnología, arquitectura y componentes de una aplicación
2022-17	Cloud privado en modo de Infraestructura como servicio
2022-88	Configuración y securización de equipos de usuario
2022-86	Inmutabilidad de los backups
2022-29	Instalacion Audivisual Salon Actos Empresariales
2022-25	Traducción de la página web de la Universidad de Almería
2022-99	Accion Social
2022-87	Adquisición centralizada de PCs para Administración
2022-43	Mejora plataforma títulos
2022-28	Renovación home UAL
2022-60	Mejoras funcionales GAU 2022 En producción una gran parte. Lo que falta es necesario en octubre y se realizará en esas fechas
2022-81	Mejorar formulario CAU específico para automatrícula Finalizado y en producción a falta de detalles internos de carácter técnico
2022-68	Actualización de la versión de Portafirmas Finalizado a falta del paso a producción que se realizará en julio tras la finalización del período de firma de actas y el proceso de selectividad
2022-90	Accesibilidad de sitios web y aplicaciones móviles de la UAL en el año 2022
2022-48	Sistema de control de aforo y ocupación en las salas de la Biblioteca Nicolás Salmerón Finalizada la instalación de la infraestructura y la aplicación. Quodus está optimizando la visualización
2022-50	Proyecto EUREKA
2022-45	PATRIMONIO DE LA UAL UN PASEO CON REALIDAD AUMENTADA
2022-64	Actualización Cookies en la web
2022-27	Plataforma Web para la Gestión, Difusión y Transparencia del Programa de Becas y Ayudas
2022-55	Servicio Mis últimos Accesos a Campus
2022-20	Ampliación de Sistema de Almacenamiento

2022-26	Envío de correo masivo de bienvenida para estudiantes de nuevo ingreso
2022-93	Adquisición de Electrónica de Red para edificio Departamental E
2022-96	Adquisición de Electrónica de Red para edificio Pabellón de Ciencias Naturales
2022-97	Adquisición de APs Wifi para edificio Departamental E
2022-95	Adquisición de APs Wifi para edificio Pabellón de Ciencias Naturales
2022-03	Buscador de convenios en la web de Secretaría General
2022-18	Infraestructura de producción para entornos de contenedores
2022-40	Aplicación Gestión de Tesis
2022-38	Gestión Presupuestaria Capítulo 1
2022-14	Mejora Aplicación Reconocimiento de Créditos

4. Proyectos retrasados sobre la fecha prevista de finalización

Relación de proyectos cuya ejecución no ha finalizado según la planificación realizada:

		Fecha prevista de fin
2022-12	Compromiso Documental Doctorado Finalizado a falta de revisión funcional y paso a producción (prevista para la segunda semana de julio)	2022-02-28
2022-17	Cloud privado en modo de Infraestructura como servicio En ejecución. Finalizada la instalación y trabajando en la migración desde el OS actual	2022-04-01
2022-05	Modificación de aplicativo en Campus Virtual de Calidad del PDI Sin comenzar	2022-05-31
2022-79	Mejorar servicio de Campus Virtual "Listados Académicos UAL" Sin comenzar. Proyecto pequeño para crear un equipo de trabajo que se abordará en un hueco de una persona	2022-06-10
2022-81	Mejorar formulario CAU específico para automatrícula Finalizado y en producción a falta de detalles internos de carácter técnico	2022-06-30
2022-43	Mejora plataforma títulos En ejecución. Revisando la conexión con el Registro de Subsanación Documental y la realización de solicitudes repetidas. No se pondrá en producción hasta avanzado el curso 22/23 dado el alto número de solicitudes que recibe el procedimiento en este período	2022-06-30
2022-68	Actualización de la versión de Portafirmas Finalizado a falta del paso a producción que se realizará en julio tras la finalización del período de firma de actas y el proceso de selectividad	2022-06-30
2022-55	Servicio Mis últimos Accesos a Campus En ejecución. Realizada la extracción de datos y trabajando en la securización de la consulta	2022-07-01
		Total: 8

5. Proyectos retrasados sobre la fecha prevista de comienzo

Relación de proyectos cuya ejecución no ha comenzado pese a estar planificada:

		Fecha prevista de inicio
2022-56	Procedimiento de pruebas de restauración periódica de bases de datos	2022-03-01
2022-05	Modificación de aplicativo en Campus Virtual de Calidad del PDI	2022-05-16
2022-79	Mejorar servicio de Campus Virtual "Listados Académicos UAL" Proyecto pequeño para crear un equipo de trabajo que se abordará en un hueco de una persona	2022-06-01
2022-39	Modificación de la Aplicación de TFE	2022-06-01
2022-02	Buscador de Normativas aprobadas en Consejo de Gobierno	2022-07-01
		Total: 5

6. Proyectos no planificados

Relación de proyectos cuya ejecución no ha sido planificada:

2022-22	Actualización y Adaptación de la Aplicación de Convocatorias Plazas Profesor Contratado Laboral	
2022-24	Tramitación de licencias y permisos del PDI	
2022-35	Instalacion Audivisual 4 Aulas Empresariales	
2022-51	Finalización del proyecto automatización solicitudes Plan Propio de Investigación y Transferencia	
		Total: 4

7. Proyectos que no serán abordados

2022-63	Citas Automatrícula Planificado para junio de 2023
---------	---

8. Proyectos seleccionados

Relación completa de proyectos seleccionados por el Consejo de Dirección:

2022-01	Mejora de control de acceso a encuestas de satisfacción con la labor docente
2022-02	Buscador de Normativas aprobadas en Consejo de Gobierno
2022-03	Buscador de convenios en la web de Secretaría General
2022-04	Censos electrónicos
2022-05	Modificación de aplicativo en Campus Virtual de Calidad del PDI
2022-07	Múltiple Factor de Autenticación
2022-08	Webs de Cultura, Cursos de Verano y Universidad de Mayores
2022-12	Aplicación Compromiso Documental Doctorado
2022-13	Web Doctorado EIDUAL
2022-14	Mejora Aplicación Reconocimiento de Créditos
2022-15	Implantación de Power BI en la gestión económica de la UAL
2022-16	Plataforma de Integración y Despliegue Continuo
2022-17	Cloud privado en modo de Infraestructura como servicio
2022-18	Infraestructura de producción para entornos de contenedores
2022-19	Inhabilitación de cuentas de usuario en la UAL
2022-20	Ampliación de Sistema de Almacenamiento
2022-21	Gestión de cuentas Amigos de la UAL
2022-22	Actualización y Adaptación de la Aplicación de Convocatorias Plazas Profesor Contratado Laboral
2022-24	Tramitación de licencias y permisos del PDI
2022-25	Traducción de la página web de la Universidad de Almería
2022-26	Envío de correo masivo de bienvenida para estudiantes de nuevo ingreso
2022-27	Plataforma Web para la Gestión, Difusión y Transparencia del Programa de Becas y Ayudas
2022-28	Renovación home UAL
2022-29	Instalacion Audiovisual Salon Actos Empresariales
2022-30	Instalacion Audiovisual Salon Usos Multiples Museo
2022-31	Instalacion Audiovisual LED Informativo Museo
2022-32	Instalacion Audiovisual 2 Salas Reuniones Empresariales
2022-33	Instalacion Audiovisual 2 Salas Reuniones CAE
2022-34	Instalacion Audiovisual 1 Sala Reuniones Central
2022-35	Instalacion Audiovisual 4 Aulas Empresariales
2022-36	Renovacion Audiovisual Aula Judicial
2022-38	Gestión Presupuestaria Capítulo 1
2022-39	Modificación de la Aplicación de TFE
2022-40	Aplicación Gestión de Tesis
2022-41	Carga de datos en UXXI de consultas en la plataforma de intermediación de datos

2022-42	Nueva solicitud de Certificaciones y Acreditaciones Académicas al Alumno
2022-43	Mejora plataforma títulos
2022-45	PATRIMONIO DE LA UAL UN PASEO CON REALIDAD AUMENTADA
2022-48	Sistema de control de aforo y ocupación en las salas de la Biblioteca Nicolás Salmerón
2022-50	Proyecto EUREKA
2022-51	Finalización del proyecto automatización solicitudes Plan Propio de Investigación y Transferencia
2022-53	Implantación de una herramienta de Chatbot
2022-55	Servicio Mis últimos Accesos a Campus
2022-56	Procedimiento de pruebas de restauración periódica de bases de datos
2022-57	Gestion de Logs de www.ual.es
2022-58	Alta de cuentas de Empleado de la UAL
2022-59	Mejoras Becas 2022
2022-60	Mejoras funcionales GAU 2022
2022-61	Mejoras TFE 2022
2022-63	Citas automátrícula
2022-64	Actualización Cookies en la web
2022-65	Actualización de la versión de Concrete
2022-66	Servidor Virtual. Unidad de Formación Continua
2022-67	Capa SOA Académico
2022-68	Actualización de la versión de Portafirmas
2022-69	Listas distribución masiva
2022-70	Web de Study Abroad
2022-72	uMove
2022-73	Oferta Plazas movilidad
2022-74	Asignaturas otros idiomas
2022-75	Sustitución De Enfriadoras CPD
2022-79	Mejorar servicio de Campus Virtual “Listados Académicos UAL”
2022-80	Mejorar procedimiento de generación de citas previas para automatrícula
2022-81	Mejorar formulario CAU específico para automatrícula
2022-83	Consulta de Documentos de Convocatorias de Becas Cerradas en RegCSD
2022-85	Visualización tipo de Beca en RCSD
2022-86	Inmutabilidad de los backups
2022-87	Adquisición centralizada de PCs para Administración
2022-88	Configuración y securización de equipos de usuario
2022-89	Mapa de Aplicaciones y APIs
2022-90	Accesibilidad de sitios web y aplicaciones móviles de la UAL en el año 2022
2022-92	Tecnología, arquitectura y componentes de una aplicación
2022-93	Adquisición de Electrónica de Red para edificio Departamental E
2022-94	Proyecto Piloto para implantación de un NAC

2022-95	Adquisición de APs Wifi para edificio Pabellón de Ciencias Naturales
2022-96	Adquisición de Electrónica de Red para edificio Pabellón de Ciencias Naturales
2022-97	Adquisición de APs Wifi para edificio Departamental E
2022-98	Implantación uMove en Alicante y Cádiz
2022-99	Accion Social
2022-100	uMove-EWP-IIAs
2022-101	Llamadas al Sistema Integral de Pagos desde aplicaciones
2022-102	Sistema Centralizado de Administracion de Equipos

9. Edición 2021 de la Cartera, proyectos finalizados

Han sido finalizados 4 de los 18 proyectos pendientes de la anterior edición de la Cartera.

2021-61	Ampliación De Sistema De Almacenamiento
2021-63	Creación Bd De Administración
2021-64	Gestion De Logs
2021-73	Evalos: Control De Presencia Se desiste de su implantación por decisión funcional

10. Otros proyectos y tareas abordadas que afectan al desarrollo de la Cartera

Otros proyectos abordados o planificados al margen de la Cartera y que afectan al desarrollo de la misma.

		Estimación
2022030210207103	web del secretariado de sostenibilidad	-
2022051210210431	Soporte a la integración de las facturas de EEPP y Centro de Lenguas con SIP	15 horas
2022051010210321	Modificación de WS de Titulados a petición de DUA	3 días
2022060210211610	Modificación Solicitud profesorado Univ Mayores	1 día
2022042710209736	Programa de Reconocimiento de créditos	11 días
