



VICERRECTORADO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

CARTERA ESTRATÉGICA DE PROYECTOS TIC 2022. SEPTIEMBRE


1. Las cifras de la edición 2022.....	2
2. Proyectos finalizados	2
3. Proyectos en curso.....	3
4. Proyectos retrasados sobre la fecha prevista de finalización.....	4
5. Proyectos retrasados sobre la fecha prevista de comienzo.....	5
6. Proyectos que no serán abordados.....	5
7. Proyectos seleccionados.....	5
8. Edición 2021 de la Cartera, proyectos finalizados	8
9. Otros proyectos y tareas abordadas que afectan al desarrollo de la Cartera	9

1. Las cifras de la edición 2022

Proyectos seleccionados: [82](#)

Proyectos finalizados hasta septiembre: [24](#) *

Proyectos en ejecución: [37](#)

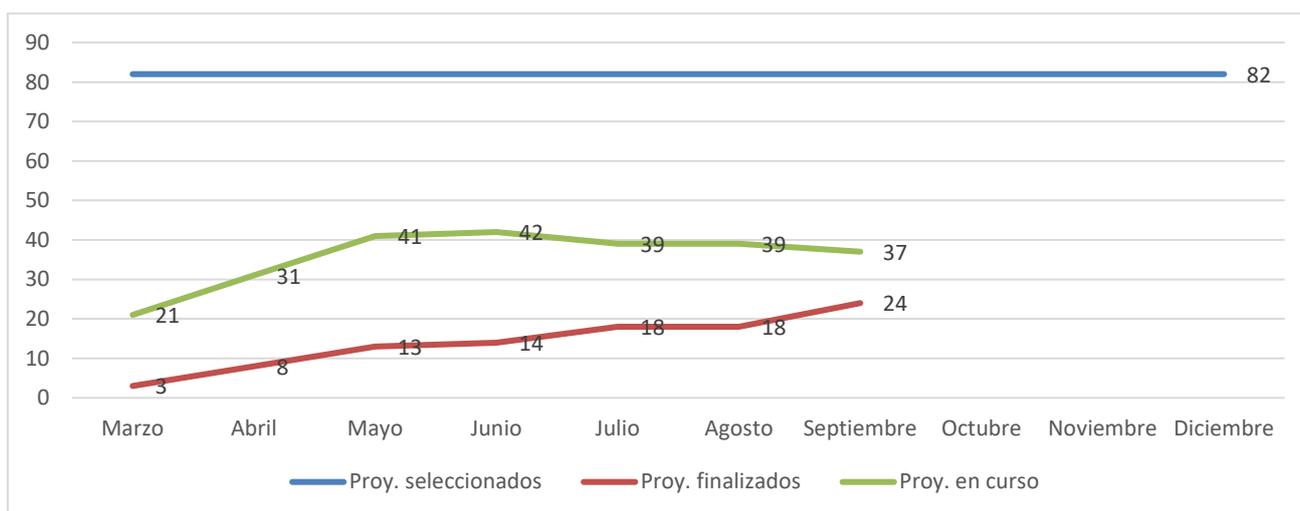

(*) Al margen de los 24 proyectos finalizados y cerrados, 6 de los que se encuentran en ejecución están ya en producción o bien finalizados a la espera de las fechas adecuadas para ello.

2. Proyectos finalizados

Relación de proyectos finalizados:

2022-57	Gestion de Logs de www.ual.es
2022-66	Servidor Virtual. Unidad de Formación Continua
2022-72	uMove (parte normativa de la solicitud realizada)
2022-36	Renovacion Audiovisual Aula Judicial
2022-33	Instalacion Audivisual 2 Salas Reuniones CAE
2022-34	Instalacion Audivisual 1 Sala Reuniones Central
2022-102	Sistema Centralizado de Administracion de Equipos
2022-04	Censos electrónicos
2022-73	Oferta Plazas movilidad
2022-01	Mejora de control de acceso a encuestas de satisfacción con la labor docente
2022-42	Nueva solicitud de Certificaciones y Acreditaciones Académicas al Alumno
2022-74	Asignaturas otros idiomas
2022-67	Capa SOA Académico

2022-53	Implantación de una herramienta de Chatbot
2022-48	Sistema de control de aforo y ocupación en las salas de la Biblioteca Nicolás Salmerón
2022-26	Envío de correo masivo de bienvenida para estudiantes de nuevo ingreso
2022-12	Aplicación Compromiso Documental Doctorado
2022-81	Mejorar formulario CAU específico para automatrícula
2022-55	Servicio Mis últimos Accesos a Campus
2022-68	Actualización de la versión de Portafirmas
2022-21	Gestión de cuentas Amigos de la UAL
2022-30	Instalacion Audivisual Salon Usos Multiples Museo
2022-31	Instalacion Audivisual LED Informativo Museo
2022-75	Sustitución De Enfriadoras CPD

3. Proyectos en curso

Relación de proyectos cuya ejecución ha comenzado:

2022-19	Inhabilitación de cuentas de usuario en la UAL La ejecución del proyecto se ha detenido a lo largo del periodo de matrícula
2022-98	Implantación uMove en Alicante y Cádiz En noviembre deberá salir la nueva convocatoria y por tanto estar en explotación
2022-100	uMove-EWP-IIAs Finalizado y en producción. Sigue en ejecución para incorporar los errores/mejoras que aparezcan
2022-65	Actualización de la versión de Concrete Planificada para octubre la segunda de las dos actualizaciones previstas
2022-13	Web Doctorado EIDUAL Se prevé su finalización a lo largo del mes de octubre
2022-08	Webs de Cultura, Cursos de Verano y Universidad de Mayores Se prevé su finalización a lo largo del mes de octubre
2022-70	Web de Study Abroad Se prevé su finalización a lo largo del mes de octubre
2022-15	Implantación de Power BI en la gestión económica de la UAL
2022-69	Listas distribución masiva
2022-92	Tecnología, arquitectura y componentes de una aplicación
2022-17	Cloud privado en modo de Infraestructura como servicio En producción a falta de la migración del total servicios y servidores de cómputo
2022-88	Configuración y securización de equipos de usuario
2022-86	Inmutabilidad de los backups
2022-29	Instalacion Audivisual Salon Actos Empresariales
2022-25	Traducción de la página web de la Universidad de Almería En fase de traducción en el Centro de Lenguas
2022-99	Accion Social Trabajando en los servicios REST de RRHH responsabilidad del STIC
2022-87	Adquisición centralizada de PCs para Administración
2022-43	Mejora plataforma títulos

	No se pondrá en producción hasta bien entrado el curso 22/23 dado el alto número de solicitudes actual
2022-28	Renovación home UAL Se prevé su finalización a lo largo del mes de octubre
2022-60	Mejoras funcionales GAU 2022 En producción una gran parte. Lo que falta es necesario en octubre y se realizará en esas fechas
2022-90	Accesibilidad de sitios web y aplicaciones móviles de la UAL en el año 2022 Seleccionada la empresa que realizará la auditoría, ésta se hará una vez implantada la nueva home
2022-50	Proyecto EUREKA Finalizado a falta de las revisiones de accesibilidad para su paso a producción (estimada a lo largo de octubre)
2022-45	PATRIMONIO DE LA UAL UN PASEO CON REALIDAD AUMENTADA
2022-64	Actualización Cookies en la web
2022-27	Plataforma Web para la Gestión, Difusión y Transparencia del Programa de Becas y Ayudas
2022-20	Ampliación de Sistema de Almacenamiento
2022-93	Adquisición de Electrónica de Red para edificio Departamental E
2022-96	Adquisición de Electrónica de Red para edificio Pabellón de Ciencias Naturales
2022-97	Adquisición de APs Wifi para edificio Departamental E
2022-95	Adquisición de APs Wifi para edificio Pabellón de Ciencias Naturales
2022-03	Buscador de convenios en la web de Secretaría General Finalizado a falta de revisión y validación por parte del usuario
2022-18	Infraestructura de producción para entornos de contenedores
2022-40	Aplicación Gestión de Tesis
2022-38	Gestión Presupuestaria Capítulo 1
2022-14	Mejora Aplicación Reconocimiento de Créditos Finalizado a falta de notificaciones fehacientes y recursos de alzada
2022-79	Mejorar servicio de Campus Virtual "Listados Académicos UAL"
2022-56	Procedimiento de pruebas de restauración periódica de bases de datos

4. Proyectos retrasados sobre la fecha prevista de finalización

Relación de proyectos cuya ejecución no ha finalizado según la planificación realizada:

		Fecha prevista de fin
2022-17	Cloud privado en modo de Infraestructura como servicio En ejecución. Finalizada la instalación y trabajando en la migración desde el OS actual	2022-04-01
2022-43	Mejora plataforma títulos En ejecución. Revisando la conexión con el Registro de Subsanción Documental y la realización de solicitudes repetidas. No se pondrá en producción hasta avanzado el curso 22/23 dado el alto número de solicitudes que recibe el procedimiento en este período	2022-06-30
2022-87	Adquisición centralizada de PCs para Administración	2022-07-29
2022-69	Listas distribución masiva	2022-07-31
2022-51	Finalización del proyecto automatización solicitudes Plan Propio de Investigación y Transferencia	2022-09-18

2022-98	Implantación uMove en Alicante y Cádiz En noviembre deberá salir la nueva convocatoria y por tanto estar en explotación	2022-09-30
2022-18	Infraestructura de producción para entornos de contenedores	2022-09-30
2022-86	Inmutabilidad de los backups	2022-09-30
		Total: 8

5. Proyectos retrasados sobre la fecha prevista de comienzo

Relación de proyectos cuya ejecución no ha comenzado pese a estar planificada:

		Fecha prevista de inicio
2022-02	Buscador de Normativas aprobadas en Consejo de Gobierno	2022-07-01
2022-51	Finalización del proyecto automatización solicitudes Plan Propio de Investigación y Transferencia	2022-08-20
2022-101	Llamadas al Sistema Integral de Pagos desde aplicaciones	2022-08-23
2022-89	Mapa de Aplicaciones y APIs	2022-09-01
2022-05	Modificación de aplicativo en Campus Virtual de Calidad del PDI	2022-09-20
2022-94	Proyecto Piloto para implantación de un NAC	2022-10-01
2022-59	Mejoras Becas 2022	2022-10-03
2022-41	Carga de datos en UXXI de consultas en la plataforma de intermediación de datos	2022-10-03
2022-16	Plataforma de Integración y Despliegue Continuo	2022-10-03
		Total: 09

6. Proyectos que no serán abordados

2022-63	Citas Automatrícula Planificado para junio de 2023
2022-32	Instalacion Audivisual 2 Salas Reuniones Empresariales Gerencia nos informa que no se van a dotar estas salas de reuniones

7. Proyectos seleccionados

Relación completa de proyectos seleccionados por el Consejo de Dirección:

2022-01	Mejora de control de acceso a encuestas de satisfacción con la labor docente
2022-02	Buscador de Normativas aprobadas en Consejo de Gobierno
2022-03	Buscador de convenios en la web de Secretaría General

2022-04	Censos electrónicos
2022-05	Modificación de aplicativo en Campus Virtual de Calidad del PDI
2022-07	Múltiple Factor de Autenticación
2022-08	Webs de Cultura, Cursos de Verano y Universidad de Mayores
2022-12	Aplicación Compromiso Documental Doctorado
2022-13	Web Doctorado EIDUAL
2022-14	Mejora Aplicación Reconocimiento de Créditos
2022-15	Implantación de Power BI en la gestión económica de la UAL
2022-16	Plataforma de Integración y Despliegue Continuo
2022-17	Cloud privado en modo de Infraestructura como servicio
2022-18	Infraestructura de producción para entornos de contenedores
2022-19	Inhabilitación de cuentas de usuario en la UAL
2022-20	Ampliación de Sistema de Almacenamiento
2022-21	Gestión de cuentas Amigos de la UAL
2022-22	Actualización y Adaptación de la Aplicación de Convocatorias Plazas Profesor Contratado Laboral
2022-24	Tramitación de licencias y permisos del PDI
2022-25	Traducción de la página web de la Universidad de Almería
2022-26	Envío de correo masivo de bienvenida para estudiantes de nuevo ingreso
2022-27	Plataforma Web para la Gestión, Difusión y Transparencia del Programa de Becas y Ayudas
2022-28	Renovación home UAL
2022-29	Instalacion Audiovisual Salon Actos Empresariales
2022-30	Instalacion Audiovisual Salon Usos Multiples Museo
2022-31	Instalacion Audiovisual LED Informativo Museo
2022-32	Instalacion Audiovisual 2 Salas Reuniones Empresariales
2022-33	Instalacion Audiovisual 2 Salas Reuniones CAE
2022-34	Instalacion Audiovisual 1 Sala Reuniones Central
2022-35	Instalacion Audiovisual 4 Aulas Empresariales
2022-36	Renovacion Audiovisual Aula Judicial
2022-38	Gestión Presupuestaria Capítulo 1
2022-39	Modificación de la Aplicación de TFE
2022-40	Aplicación Gestión de Tesis
2022-41	Carga de datos en UXXI de consultas en la plataforma de intermediación de datos
2022-42	Nueva solicitud de Certificaciones y Acreditaciones Académicas al Alumno
2022-43	Mejora plataforma títulos
2022-45	PATRIMONIO DE LA UAL UN PASEO CON REALIDAD AUMENTADA
2022-48	Sistema de control de aforo y ocupación en las salas de la Biblioteca Nicolás Salmerón
2022-50	Proyecto EUREKA
2022-51	Finalización del proyecto automatización solicitudes Plan Propio de Investigación y Transferencia

2022-53	Implantación de una herramienta de Chatbot
2022-55	Servicio Mis últimos Accesos a Campus
2022-56	Procedimiento de pruebas de restauración periódica de bases de datos
2022-57	Gestion de Logs de www.ual.es
2022-58	Alta de cuentas de Empleado de la UAL
2022-59	Mejoras Becas 2022
2022-60	Mejoras funcionales GAU 2022
2022-61	Mejoras TFE 2022
2022-63	Citas automátrícula
2022-64	Actualización Cookies en la web
2022-65	Actualización de la versión de Concrete
2022-66	Servidor Virtual. Unidad de Formación Continua
2022-67	Capa SOA Académico
2022-68	Actualización de la versión de Portafirmas
2022-69	Listas distribución masiva
2022-70	Web de Study Abroad
2022-72	uMove
2022-73	Oferta Plazas movilidad
2022-74	Asignaturas otros idiomas
2022-75	Sustitución De Enfriadoras CPD
2022-79	Mejorar servicio de Campus Virtual “Listados Académicos UAL”
2022-80	Mejorar procedimiento de generación de citas previas para automatrícula
2022-81	Mejorar formulario CAU específico para automatrícula
2022-83	Consulta de Documentos de Convocatorias de Becas Cerradas en RegCSD
2022-85	Visualización tipo de Beca en RCSD
2022-86	Inmutabilidad de los backups
2022-87	Adquisición centralizada de PCs para Administración
2022-88	Configuración y securización de equipos de usuario
2022-89	Mapa de Aplicaciones y APIs
2022-90	Accesibilidad de sitios web y aplicaciones móviles de la UAL en el año 2022
2022-92	Tecnología, arquitectura y componentes de una aplicación
2022-93	Adquisición de Electrónica de Red para edificio Departamental E
2022-94	Proyecto Piloto para implantación de un NAC
2022-95	Adquisición de APs Wifi para edificio Pabellón de Ciencias Naturales
2022-96	Adquisición de Electrónica de Red para edificio Pabellón de Ciencias Naturales
2022-97	Adquisición de APs Wifi para edificio Departamental E
2022-98	Implantación uMove en Alicante y Cádiz
2022-99	Accion Social
2022-100	uMove-EWP-IIAs

2022-101	Llamadas al Sistema Integral de Pagos desde aplicaciones
2022-102	Sistema Centralizado de Administracion de Equipos

8. Edición 2021 de la Cartera, proyectos finalizados

Han sido finalizados 8 de los 18 proyectos pendientes de la anterior edición de la Cartera.

2021-61	Ampliación De Sistema De Almacenamiento
2021-63	Creación Bd De Administración
2021-64	Gestion De Logs
2021-73	Evalos: Control De Presencia Se desiste de su implantación por decisión funcional
2021-36	Desarrollo Y Adaptación De "Umove" 1. Programa De Gestión De La Movilidad.
2021-28	E-Admón. 6: Gestión Documental
2021-30	E-Admón. 9: Notificaciones Electrónicas Fehacientes
2021-31	E-Admón. 5: Registro Electrónico

9. Otros proyectos y tareas abordadas que afectan al desarrollo de la Cartera

Otros proyectos abordados o planificados al margen de la Cartera y que afectan al desarrollo de la misma.

		Estimación
2022030210207103	web del secretariado de sostenibilidad	-
2022051210210431	Soporte a la integración de las facturas de EEPP y Centro de Lenguas con SIP	15 horas
2022051010210321	Modificación de WS de Titulados a petición de DUA	3 días
2022060210211610	Modificación Solicitud profesorado Univ Mayores	1 día
2022042710209736	Programa de Reconocimiento de créditos	11 días
